

# ご近隣の皆様へ

## 目黒線奥沢駅改修工事 2月の工事予定


※1/31初電より目黒方面行の駅構内通路が変更されます。詳しくは駅構内掲示の案内をご覧ください。

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定であります。作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

**工程表**       : 昼間作業(8:00~18:00予定)       : 夜間作業(22:00~翌6:00予定)       : 昼夜間作業(8:00~18:00、22:00~翌6:00予定)

工種	2021年1月							2021年2月							2021年3月							備考																										
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7					
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日						
<b>道路使用作業</b>	自由通り(踏切・改札前付近) 道路規制(機材搬出)      自由通り(車庫前~交番付近) 道路規制(重機搬出)																																															
① 土木工事	仮設工事	資器材搬入出作業																					昼夜間作業にて工事ヤードの資器材の搬入出を行います。昼間作業にて材料の加工等を行います。夜間、車両が入り出します。																									
	下りホーム工付帯工事	ホーム床板設置、仕上げ																					夜間作業にて、ホーム床板の設置および床面仕上げ工事を行います。																									
	上りホーム工	上りホーム舗装、床面タイル工事																					昼間作業にてホーム床面の仕上げ工事を行います。																									
	上り通路変更	通路変更に伴う仮通路、仮囲い設置							上り通路変更(仮囲い盛替、仮設備設置)														昼夜間作業にて通路変更に伴う通路整備を行い、1/30夜間にて通路切替を行います。1/31初電より通路が切り替わります。																									
	現上りホーム撤去								通路閉鎖区間ホーム撤去工事														通路変更後、昼夜間作業にて、ホーム閉鎖区間のホーム撤去を行います。																									
② 保線工事	軌道敷設	砕石散布							軌道整備、砕石散布							軌道整備							現場整理	昼夜間作業にて軌道敷設・軌道整備を行います。※夜間重機の搬出を行います。																								
	分岐器敷設	分岐器組立																					分岐器敷設							昼夜間作業にて分岐敷設準備・分岐器敷設を行います。																		
		軌道整備準備							現場調査							レール交換							まくらぎ交換準備							資器材運搬							分岐交換準備							分岐交換準備				
③ 電気工事	上りホームドア工事	2番線ケーブル・ラック撤去							2番線ホームドア撤去																					夜間、目黒方面行改札口付近で道路規制を行いホームドアの撤去を行います。																		
	電路工事支持物作業	資器材搬入作業							電路柱建植準備作業																					夜間、電路柱の建植の準備作業を行います。また、資器材の搬入を行います。																		
	電路工事架線調整															架線調整作業														夜間、本線架線の調整作業を行います。																		
	信号工事	機器取付、ケーブル撤去							機器取付、ケーブル撤去																					昼夜間作業にてケーブルおよび機器取付、撤去を行います。																		
	通信工事	通路切り替えに伴う機器移設作業							ケーブル撤去、ケーブル整理、トラフ撤去							トラフ撤去							トラフ撤去							ケーブル布設							ケーブル布設							1/30に設備の移設作業を行います。その後はトラフ撤去、ケーブル布設作業を行います。				
	設備工事	通路切り替えに伴う照明器具取付・撤去							2番線ホーム終点方照明器具・防犯設備撤去							2番線ホーム不要ケーブル撤去							2番線ホーム不要ケーブル撤去及び車庫線内照明器具取付														1/30に通路切替に伴います照明器具取付撤去作業を行います。その後は2番線ホームの照明器具の一部撤去作業を行います。											
④ 建築工事	駅ビル改修工事	既存階段解体、解体材搬出																												階段鉄骨工事	昼間作業にて建物の内部改修工事、解体工事。夜間作業にて資器材搬入作業を行います。																	
	ホーム上家工事	上下ホーム上家改修工事							上り通路変更(仮囲い盛替)																					昼間・夜間作業にて上下ホーム上家の鉄骨解体、屋根解体、鉄骨架替、鉄骨建方工事を行います。																		

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。

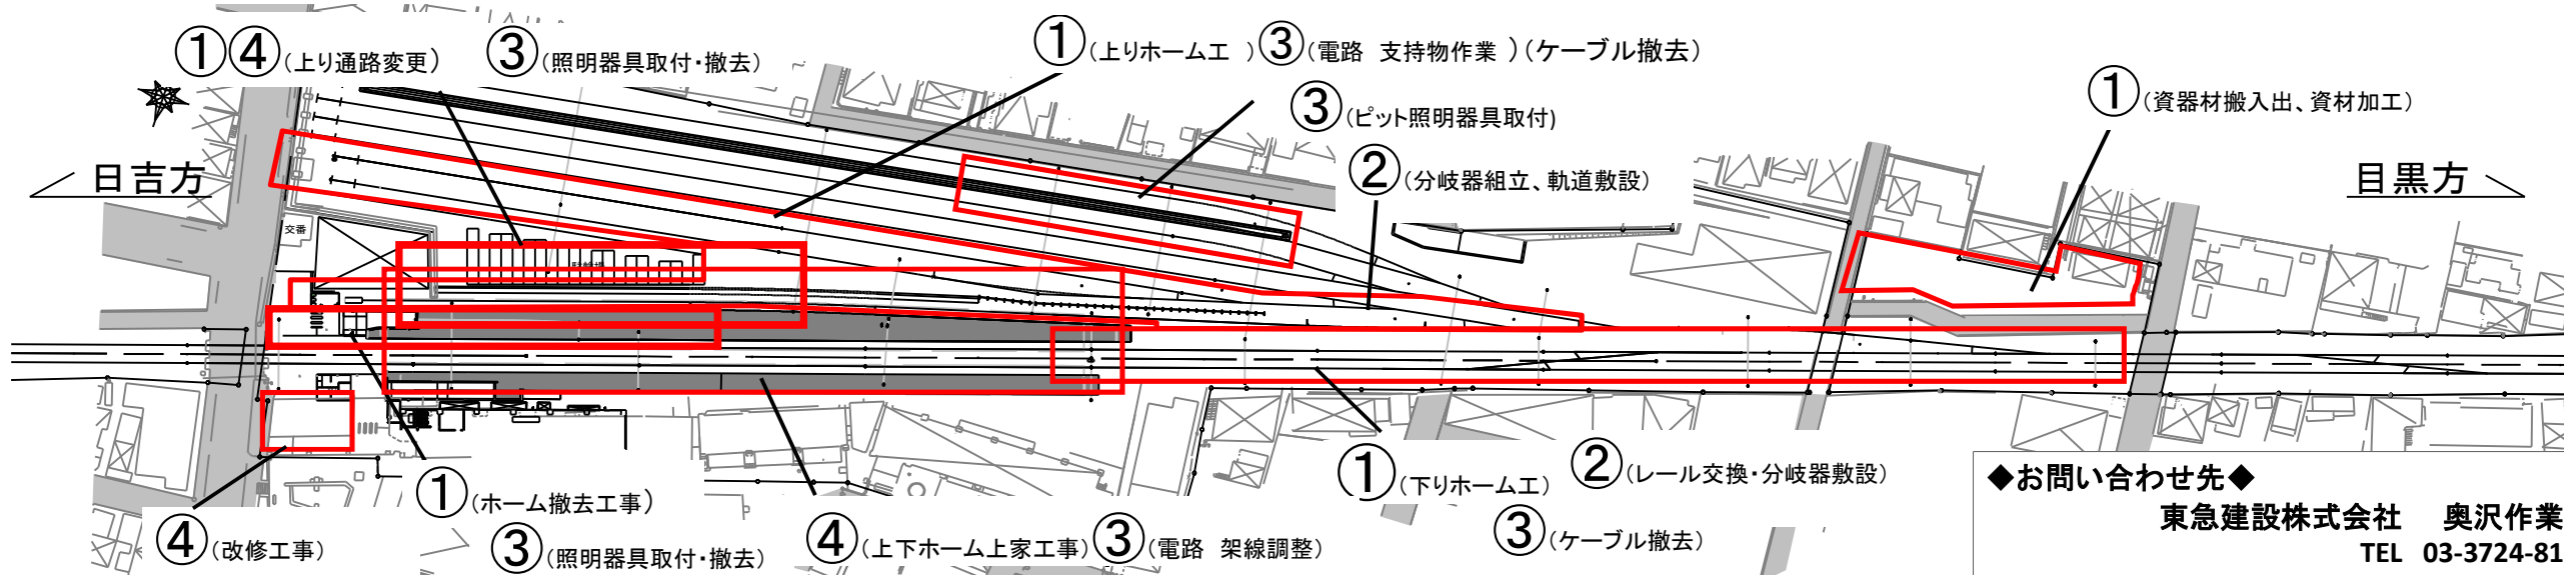

◆お問い合わせ先◆  
**東急建設株式会社 奥沢作業所**  
 TEL 03-3724-8117
