ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事　12月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定でおります。
作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表

:昼間作業（8:00～18:00予定）　:夜間作業（22:00～翌6:00予定）　:昼夜間作業（8:00～18:00、22:00～翌6:00予定）

	工種		2019年11月	2019年12月	2020年1月	備　考
①	土木工事	仮設工事	資器材搬入出、木材加工ほか			昼夜間作業にて工事ヤードの資器材の搬入出を行います。昼間作業にて材料の加工等を行います。
		通路整備		車庫内通路整備		昼間作業にて車庫内の通路の設置・調整を行います。
		木製覆工設置	木製覆工準備工			軌道内に木製覆工を設置します。夜間作業にて設置します。
②	保線工事	車庫工事	軌框組立、軌道整備	軌框組立、軌道整備 軌道整備	資機材片付け、点検	車庫線内にて軌道の組立、軌道整備、道床砕石散布を行います。
		本線工事	まくらぎ交換 線路打上準備、根太まくらぎ敷設 線路打上	砕石運搬 線路打上準備、根太まくらぎ敷設 線路打上 砕石運搬 線路打上準備、根太まくらぎ敷設 分岐材運搬 線路打上	砕石運搬 線路打上準備、根太まくらぎ敷設 線路打上 軌道整備 資機材片付け、現場点検	まくらぎ交換、道床砕石の散布、線路打上を行います。 木製覆工設置の為の根太まくらぎの敷設を行います。
③	電気工事	車庫内工事		新設電路柱基礎掘削		昼夜間作業にて新設電柱の基礎掘削を行います。
			資材搬入			夜間にて新設電柱の基礎築造に伴い資材の搬入を行います。
			信号工事			昼夜作業にてケーブル切替、支障物移転、ケーブル敷設、撤去作業を行います。
		室内工事			設備工事	車庫内の電気室にて照明器具の取付、配線配管等を行います。
④	建築工事	A口改修工事	場内整備	山留工事 土工事 基礎コンクリート工事	床　型枠、鉄筋工事 床コンクリート打設 場内整備 基礎工事	主に昼間作業で工事ヤード内にて通路整備工事を行います。12月下旬に夜間工事で床のコンクリートを打設致します。
⑤	その他					

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。

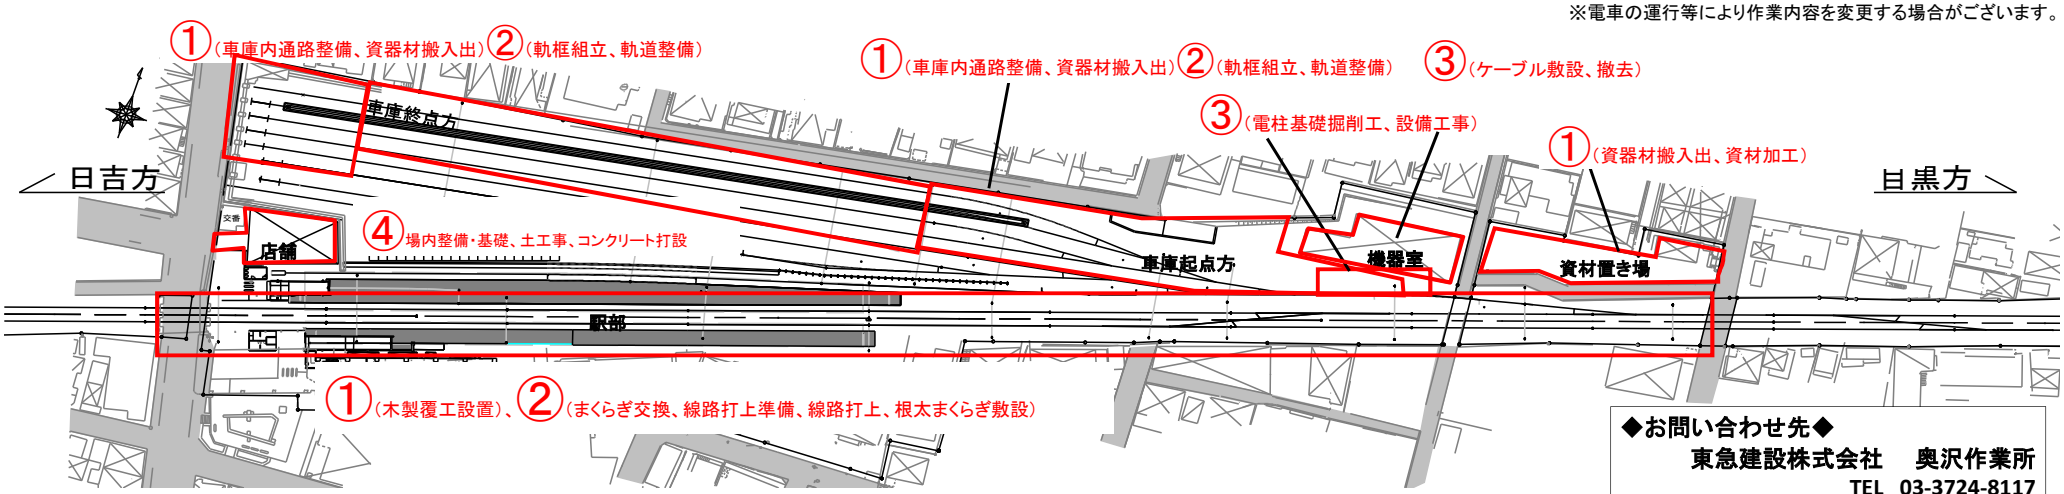

◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社　奥沢作業所
TEL　03-3724-8117
