ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事　11月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定でおります。
作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表

:昼間作業（8:00～18:00予定）　:夜間作業（22:00～翌6:00予定）　:昼夜間作業（8:00～18:00、22:00～翌6:00予定）

	工種		2019年10月 28 月	29 火	30 水	31 木	2019年11月 1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	2019年12月 1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	備考
①	土木工事	仮設工事	工事ヤード整備、資器材搬入出																					架設スロープ撤去																						工事ヤードの整備、資器材の搬入出を昼間作業にて行います。
		スロープ改修															スロープ部排水整備																												車庫入り口部のスロープを改修します。昼間作業にて行います。
		木製覆工設置															木製覆工準備工							木製覆工設置																					軌道内に木製覆工を設置します。準備を昼間行い、夜間作業にて設置します。
②	保線工事	車庫工事	軌道組立、砕石散布							軌道組立、分岐器組立							軌道組立、分岐器組立、砕石散布							軌道整備							軌道整備							軌道組立、砕石散布							車庫線内にて分岐器および軌道の組立、軌道整備、道床砕石散布を行います。
		本線工事	砕石運搬 線路打上準備							線路打上 砕石運搬 線路打上準備							線路打上 砕石運搬 線路打上準備							線路打上準備、根太まくらぎ敷設			線路打上 砕石運搬				砕石運搬 線路打上準備、根太まくらぎ敷設				線路打上			砕石運搬 線路打上準備、根太まくらぎ敷設				線路打上			道床砕石の散布、線路打上を行います。木製覆工設置の為の根太まくらぎの敷設を行います。
③	電気工事	車庫内工事	電車線支持替え					電柱撤去		電車線支持替え							電車線支持替え				電柱撤去			電柱基礎築造											電車線支持替え		電柱基礎築造							
			信号工事																																										昼夜作業にてケーブル切替、支障物移転、ケーブル敷設、撤去作業を行います。
		室内工事																																											
④	建築工事	仮設・調査工事															工事ヤード整備、資機材搬出入・地盤調査工事																												工事ヤードの整備、資器材の搬入出を昼間作業にて行います。
		A口改修工事																													山留工事														工事ヤード内にてA口部分の改修工事を昼間作業にて行います。
⑤	その他																																												

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。

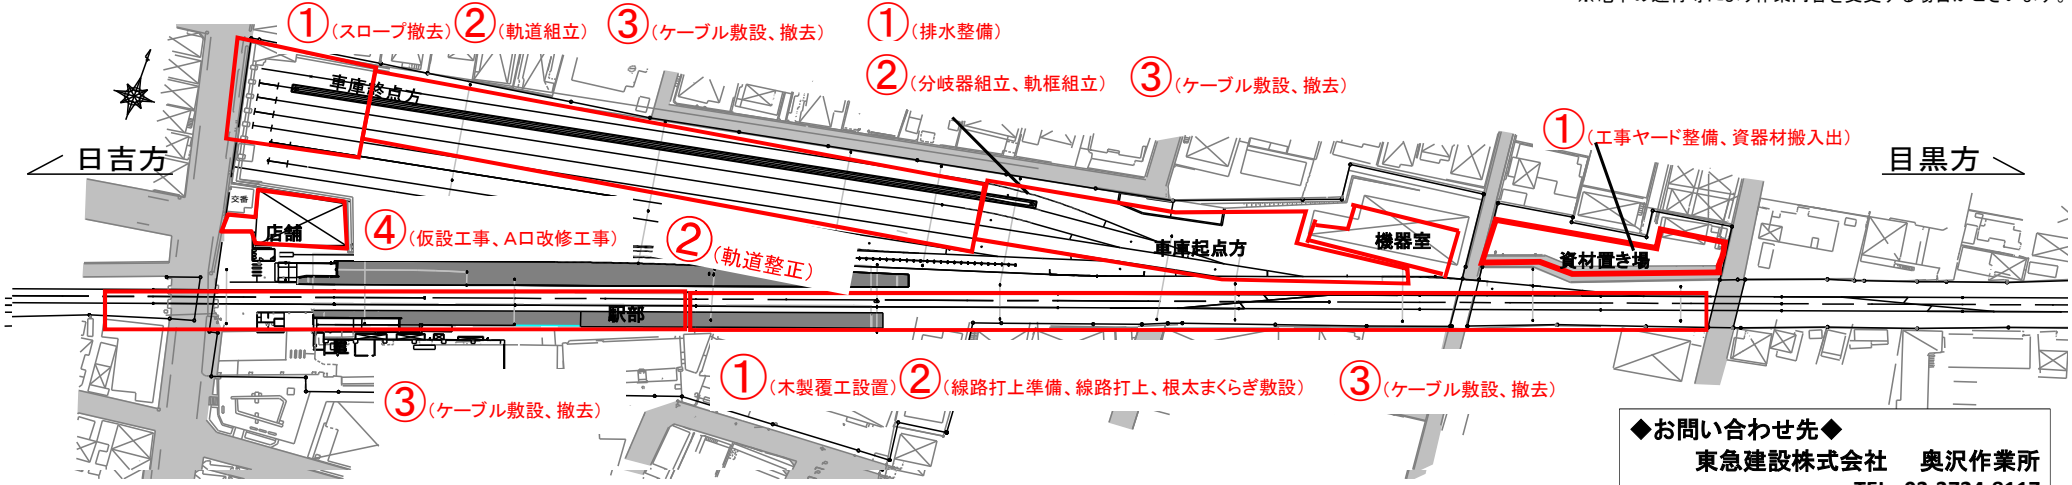

◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社　奥沢作業所
TEL　03-3724-8117
