ご近隣の皆様へ

目黒線奥沢駅改修工事　8月の工事予定

平素より東急線鉄道事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。目黒線奥沢駅改修工事について、下記の工程表に基づき実施する予定でおります。
作業によっては比較的大きな音の出る作業が伴います。工事中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒、皆様方のご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

工程表　　：昼間作業（8:00～18:00予定）　　：夜間作業（22:00～翌6:00予定）　　：昼夜間作業（8:00～18:00、22:00～翌6:00予定）

	工種		2019年7月 29 月	30 火	31 水	2019年8月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土	2019年9月 1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	備考
①	土木工事	撤去工事	支障物撤去																																										車庫線内の支障施設物の撤去を行います。
			バラスト撤去、路盤掘削・搬出																																										車庫線内のバラスト（砂利）の撤去、掘削を行います。
		仮設工事	工事ヤード整備																																										基礎構築等に付帯するヤード内整備関係を行います。一部夜間作業となります。
		車庫ピット	車庫ピット　コンクリート躯体構築																					車庫ピット　コンクリート躯体構築																					車庫内ピットのコンクリート躯体の構築を行います。昼間作業となります。
		路盤工	排水設備整備							線路路盤補強														バラスト投入・敷き均し																					昼間作業にて排水路の整備を行います。線路の路盤の補強、バラスト投入を行います。資機材の搬入は夜間作業となります。
		基礎構築	コンクリート基礎構築																					コンクリート基礎構築																					基礎杭、基礎の構築を行います。資機材の搬入など一部夜間作業となります。
②	保線工事	車庫工事	車庫ピット補修							車庫ピット補修															軌框組立						軌框組立							軌框組立								車庫線内にてピット補修及び軌框（レール、枕木）組立を行います。
																															分岐器運搬															
		本線工事	分岐器撤去準備			レール運搬				分岐器撤去準備															分岐器撤去準備						分岐器撤去準備									分岐器撤去準備					夜間作業にて資機材、レールの運搬を行います。分岐器の撤去準備、分岐器の撤去を行います。
					分岐器撤去																						分岐器撤去					分岐器撤去							資機材運搬				分岐器撤去			
																																										予備		
③	電気工事	車庫内工事	ケーブル及び分岐撤去作業							ケーブル及び分岐撤去作業														ケーブル及び分岐撤去作業							ケーブル及び分岐撤去作業							ケーブル及び分岐撤去作業							昼夜間作業にて分岐撤去作業、電柱基礎の掘削作業～基礎杭、基礎構築を行います。また、機器室内でも切替作業を行います。
			ケーブル防護移設、基礎部試掘							電路柱基礎掘削・搬出														電路柱基礎掘削・搬出							電路柱基礎掘削・搬出							電路柱基礎掘削・搬出							
																															基礎杭打設、基礎構築							基礎杭打設、基礎構築							
					保守業務（電気設備点検）					保守業務（電気設備点検）																																			
		室内工事	ケーブル撤去及び動作確認作業							ケーブル撤去及び動作確認作業																保守業務（電気設備更新）						保守業務（電気設備更新）							ケーブル撤去及び動作確認作業							車庫内の電気諸室にて受電設備更新に伴う、資機材搬入等を行います。
																								ケーブル撤去及び動作確認試験							ケーブル撤去及び動作確認試験														
④	建築工事																																												
⑤	その他																																												

※電車の運行等により作業内容を変更する場合がございます。

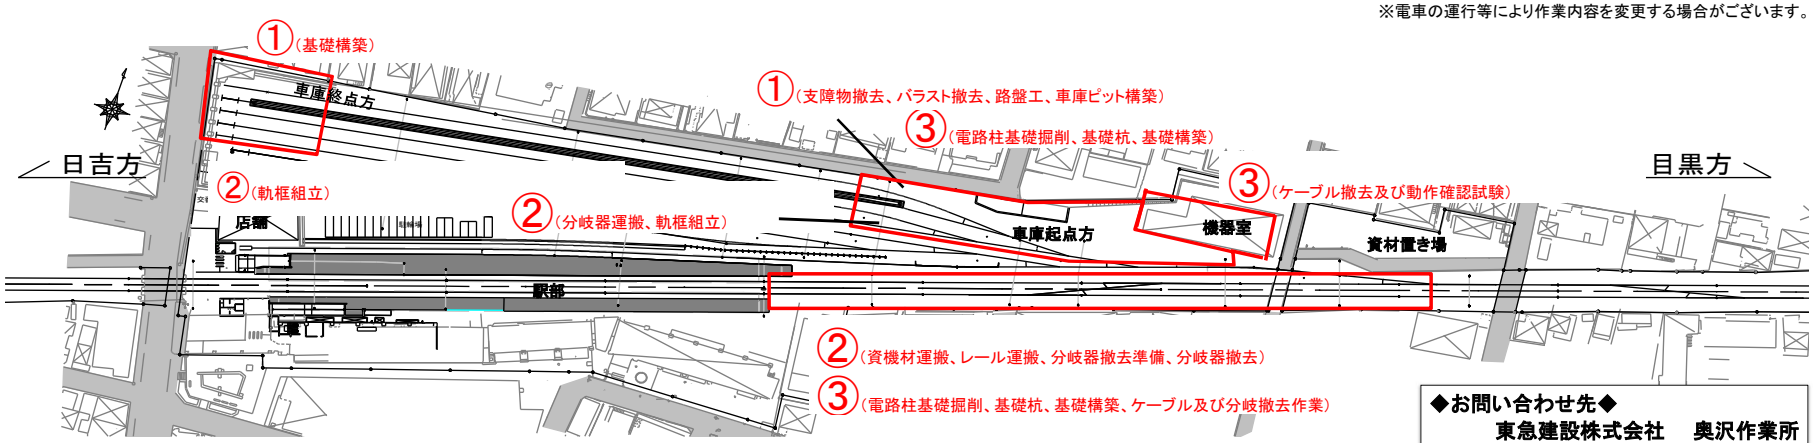

◆お問い合わせ先◆
東急建設株式会社　奥沢作業所
TEL　03-3724-8117
